


2 Organisation, engagerade och finansiering

Jens Blomquist, SBU

Någon egentlig och formell organisation fanns inte för 4T under projektperioden. Däremot fanns ett informellt nätverk i form av en arbetsgrupp, som fungerade som motor och drivkraft i arbetet. Driv- och smörjmedel till detta arbete kom huvudsakligen från två källor – dels från SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, dels från betodlare och industri via Sockernäringsens Samarbetskommitté och senare Sockernäringsens BetodlingsUtveckling. Se figur 1.

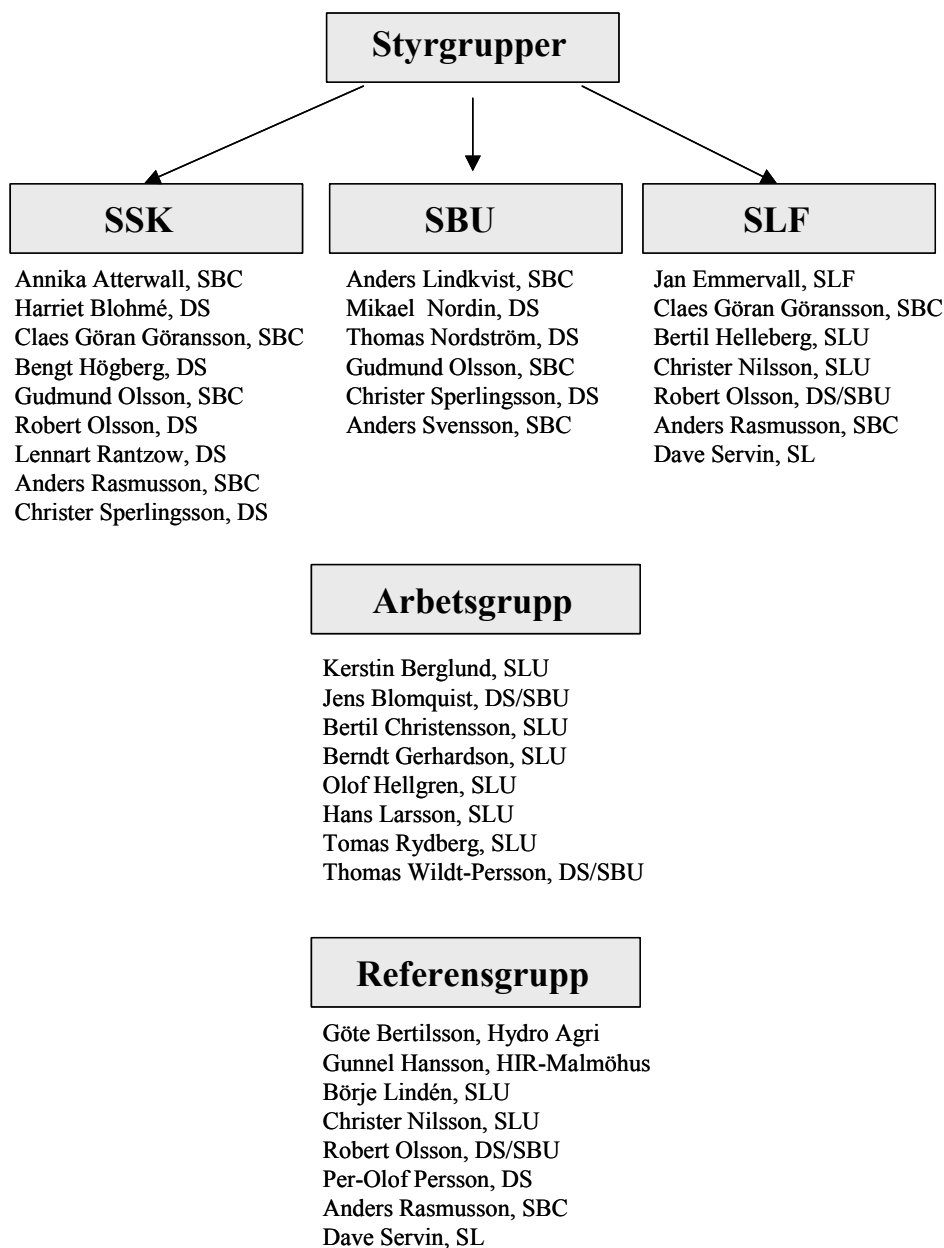

Figur 1. Styrgrupper, arbetsgrupp och referensgrupp för projekt 4T.

Sockernäringens Samarbetskommitté (SSK) agerade som styrgrupp från projektstarten 1997 fram till årsskiftet 2000. Då upphörde SSK genom att Danisco Sugar AB omorganiserade sin verksamhet. Från årsskiftet 2000/2001 gick ansvaret som styrgrupp för projekt 4T över till styrelsen för *Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB (SBU)*.

Parallellt fanns ytterligare en styrgrupp för projekt 4T. För den vetenskapliga utvärderingen av projekt 4T söktes nämligen pengar från *Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)*. Beredningsgruppen för FoU-programmet Uthållig och lönsam sockerproduktion blev därmed styrgrupp för den delen av projektet.

I *arbetsgruppen* drevs arbetet framåt genom gemensamma insatser från alla som var direkt verksamma i projektet. *Referensgruppen* fungerade som bollplank åt arbetsgruppen vid gemensamma möten i både fält och på sal.

Organisationen blev otydlig med tre olika styrgrupper. Några projektöverenskommelser fanns heller inte från beställarnas/styrgruppernas sida och därmed var frågan om ansvar och befogenheter oklar. Trots det fortskred arbetet med projektet inom arbetsgruppen, framför allt tack vare frivilligt samarbete och gemensamt intresse kring frågeställningarna inom projekt 4T.

Finansiering

Sockernäringens Samarbetskommitté avsatte speciellt öronmärkta pengar till parstudien inom 4T. Totalt under åren 1997-2000 innebar det 3 miljoner kronor.

Fältförsöken inom 4T bekostades också inom SSKs budget och belöpte på cirka 1 miljon kronor under 1998, 1999 och 2000, dvs också totalt 3 miljoner kronor under de första åren. Under 2001 kostade fältförsöken ca 300 000 kronor i SBU:s budget. Totalt kostade fältförsöken under åren 1998-2001 därför ca 3,3 miljoner kronor. Av denna summa finansierade Partek Nordkalk försöken med strukturkalkning med sammanlagt nästan 200 000 kronor.

Ur Stiftelsen Lantbruksforskningens FoU-program för Uthållig och lönsam sockerproduktion erhöles ytterligare 4,4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt inom markens biologi, fysik och kemi knutna till parstudien och fältförsöken, samt en tillväxtstudie i klimatkammare på Biotronen, SLU.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien bidrog med 40 000 kronor under 1998 och ytterligare 20 000 kronor under 1999 till undersökningar om aggregatstabilitet efter strukturförbättring med släckt kalk.

I fältförsöken med olika förfrukter till sockerbetor betalade Skåneförsöken cirka en tredjedel av kostnaden för förfruktsåret, totalt 180 000-200 000 kronor under tre år, samt hela kostnaden för år tre, året efter sockerbetorna, totalt 380 000-400 000 kronor. Ytterligare ca 200 000 kronor betalade Skåneförsöken för efterverkansåret i stråsäd i strukturkalkningsförsöken. Skåneförsöken finansierade alltså projekt 4T med omkring 800 000 kronor.

Utöver dessa medel kom direkt från Danisco Sugar AB och senare från SBU, lön och omkostnader till Jens Blomquist motsvarande omkring 700 000 kronor per år under 1997-2001, totalt 3,5 miljoner kronor.

Den totala satsningen från olika finansörer innebar alltså en ram på drygt 15 miljoner kronor under åren 1997-2001 för projekt 4T.
